



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

MISE À 2X2 VOIES DE LA RN57 ENTRE L'ÉCHANGEUR DE LA GARE TGV ET DEVECEY

**Réunion publique
Châtillon-le-Duc
16/04/2024**

Ordre du jour :

1. Point sur l'avancement des travaux de la RN57 - Prochaines étapes du chantier (DREAL)
2. Travaux de la rue Léon Baud : présentation de l'aménagement définitif et calendrier de finalisation des travaux (DREAL et GBM)
3. Présentation du projet de réaménagement de la traversée de Cayenne après la mise en service de la nouvelle RN57 (GBM)
4. Présentation du projet d'aménagement d'une liaison cyclable entre le giratoire de Devecey et le collège (GBM)
5. Questions diverses

AVANCEMENT DU CHANTIER : COTE NORD



AVANCEMENT DU CHANTIER : COTE SUD



AVANCEMENT DU CHANTIER : Rue Léon Baud

Les réseaux sont désormais tous rétablis dans l'ouvrage



L'aménagement final de la rue de part et d'autre de l'ouvrage reste à faire

AVANCEMENT DU CHANTIER : AU CENTRE



Les travaux de terrassement, de soutènement, d'assainissement et de chaussée sont à réaliser dans le secteur de l'ancienne déviation provisoire

PLANNING DES ETAPES A VENIR

SECTION CENTRALE :

*Perturbations
de circulation
prévues*

Coupure de déviation temporaire de la rue Léon Baud à partir du 15 avril pour 2 mois environ

Durée

10 semaines

*Travaux
réalisés*

- Réalisation de l'aménagement définitif de la rue Léon Baud
- Réalisation des terrassements, parois clouées, réseaux et chaussées sur la section centrale jusqu'à fin juillet

1. Point sur l'avancement des travaux de la RN57

SECTION CENTRALE :



PLANNING DES ETAPES A VENIR

*Perturbations
de circulation
prévues*

Mi juin : Basculement de l'ensemble de la circulation à 2x1 voies depuis la plaine de Miserey sur le sens Vesoul → Besançon jusqu'à Cayenne

Durée

7 semaines

*Travaux
réalisés*

- Travaux de raccordement du côté sud sur le sens Besançon → Vesoul jusqu'à fin juillet

Phase 2

RACCORDEMENT COTE SUD (1ère moitié)



Phase 2

PLANNING DES ETAPES A VENIR

*Perturbations
de circulation
prévues*

- A partir de début août :
Mise en service partielle de la nouvelle RN57 (une voie dans chaque sens)
Basculement de l'ensemble de la circulation à 2x1voies depuis la plaine de Miserey sur le sens Besançon → Vesoul jusqu'au nord de Devecey
- Fermeture de la bretelle Devecey → Vesoul
- Accès à la gare TGV depuis Vesoul en passant par l'ancienne RN57


Durée

7 semaines

*Travaux
réalisés*

- Travaux de raccordement du côté sud sur le sens Vesoul → Besançon
- Travaux de la bretelle Devecey → Vesoul

RACCORDEMENT COTE SUD (2ème moitié)

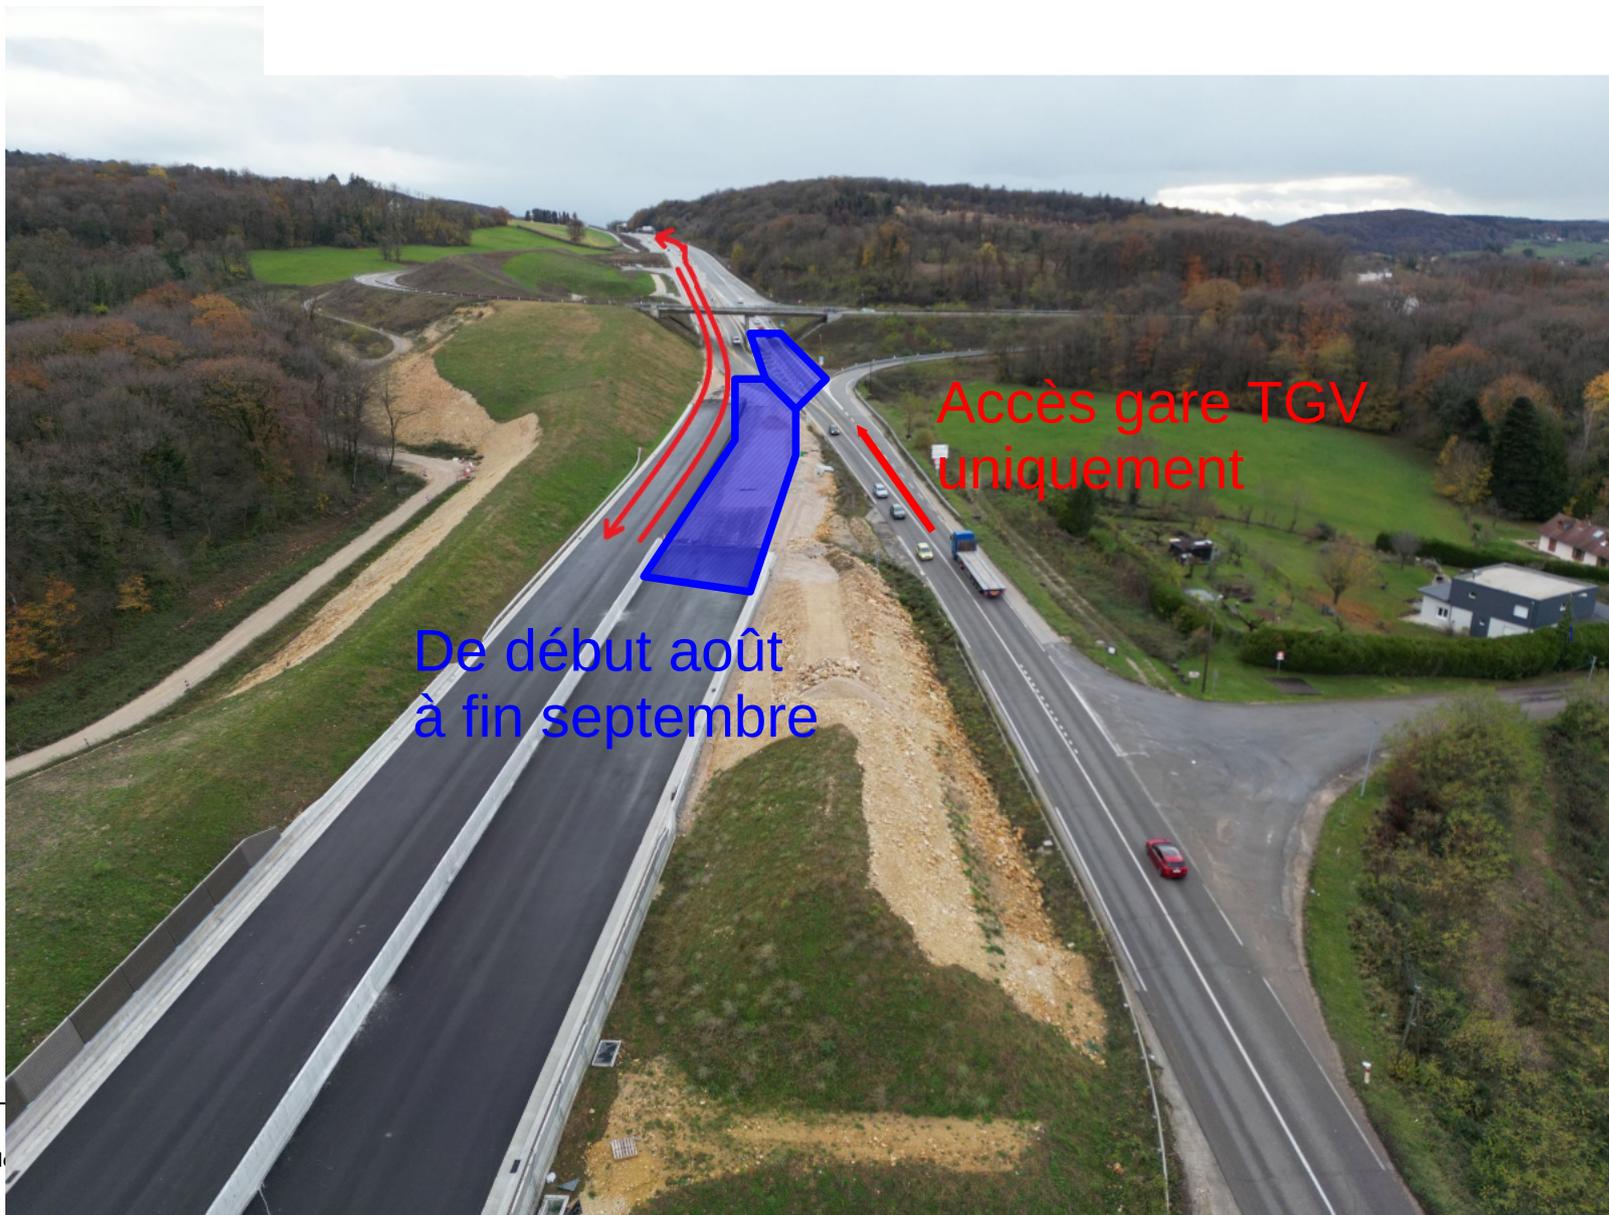

BRETELLE Devecey → Vesoul



Bretelle coupée

De début août
à fin septembre

Accès Cayenne et
gare TGV
uniquement

PLANNING DES ETAPES A VENIR

*Perturbations
de circulation
prévues*

- A partir de fin septembre :
Maintien de la mise en service partielle de la nouvelle RN57 (une voie dans chaque sens)
Basculement de l'ensemble de la circulation à 2x1voies depuis la plaine de Miserey sur le sens Besançon → Vesoul
- Fermeture de la bretelle Devecey → Vesoul


Durée

4 semaines


*Travaux
réalisés*

- Travaux de la bretelle Vesoul → Gare TGV
- Travaux de la bretelle Devecey → Vesoul
- Travaux sur le giratoire de Devecey

BRETELLE Vesoul → Gare TGV

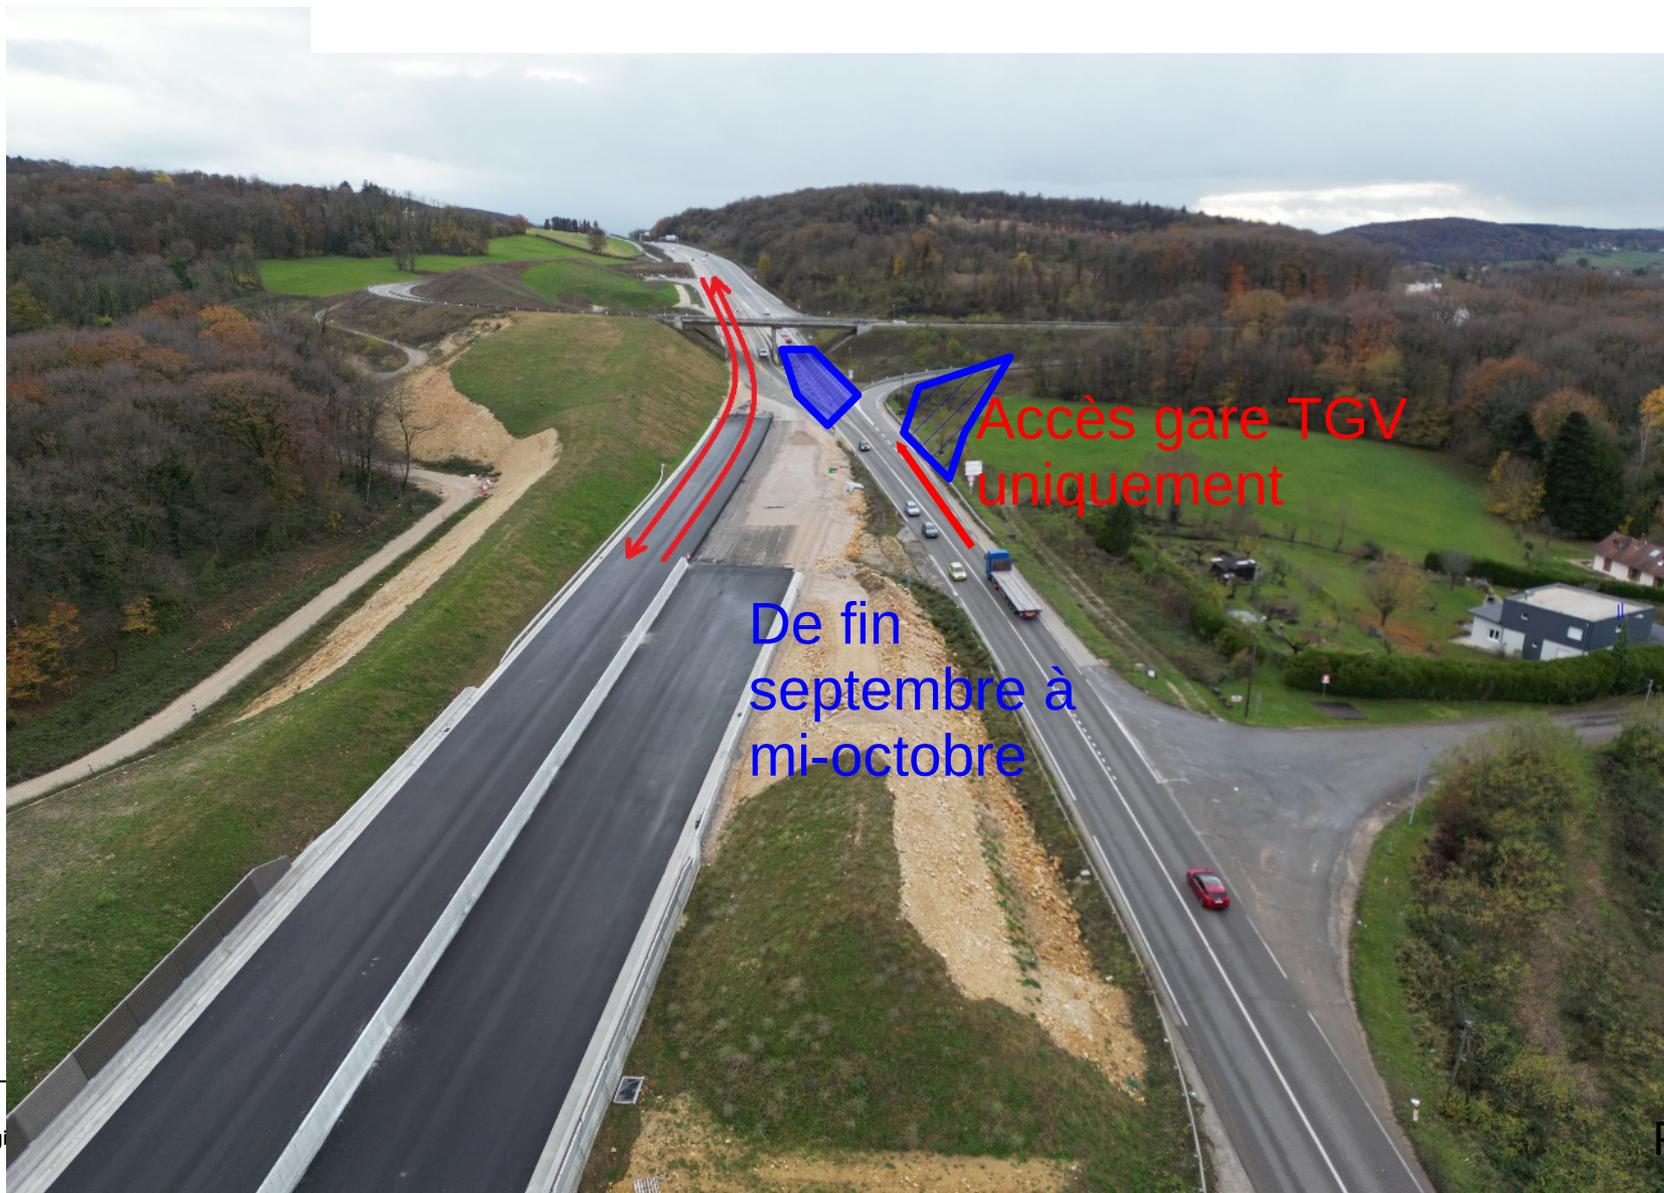

BRETELLE Devecey → Vesoul + Giratoire de Devecey

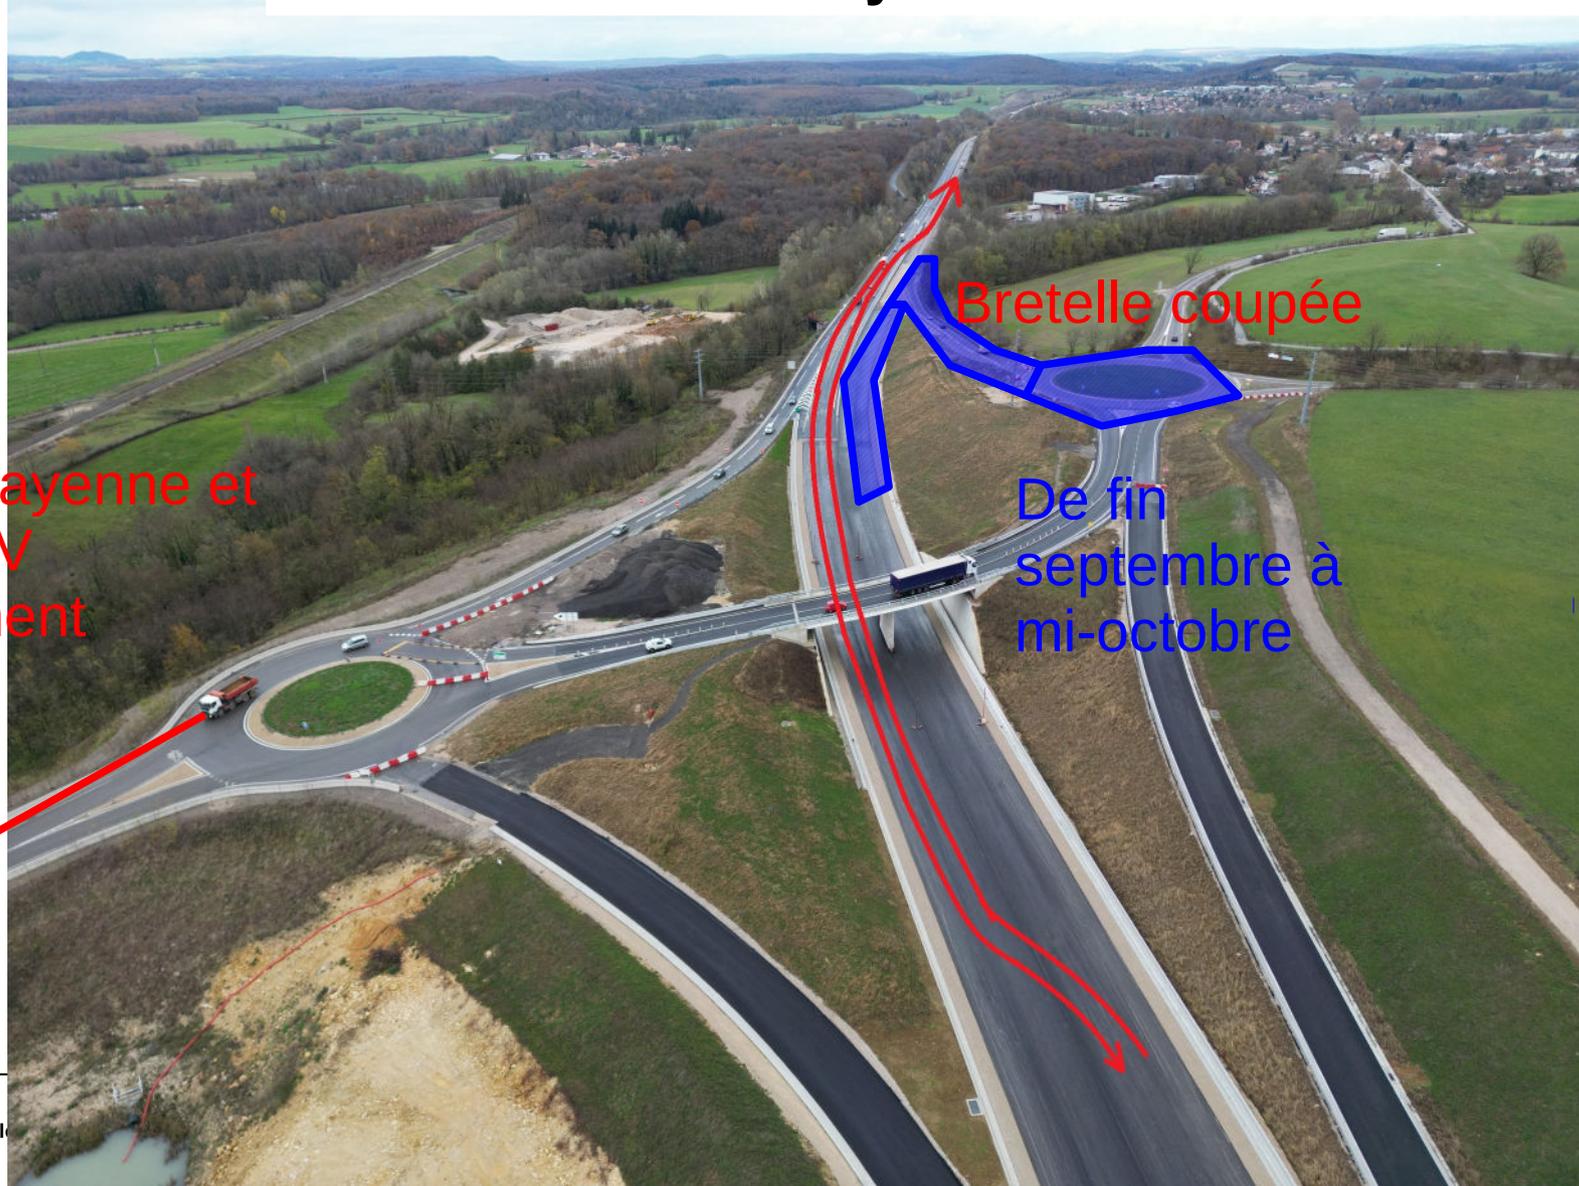

Accès Cayenne et
gare TGV
uniquement

Bretelle coupée

De fin
septembre à
mi-octobre

PLANNING DES ETAPES A VENIR

*Perturbations
de circulation
prévues*

- A partir de mi-octobre :
Maintien de la mise en service partielle de la nouvelle RN57 (une voie dans chaque sens)
Basculement de l'ensemble de la circulation à 2x1voies depuis la plaine de Miserey sur le sens Besançon → Vesoul
- Fermeture de la bretelle Vesoul → Gare TGV pendant 15 jours


Durée

2 semaines


*Travaux
réalisés*

- Travaux de la bretelle Vesoul → Gare TGV

BRETELLE Vesoul → Gare TGV

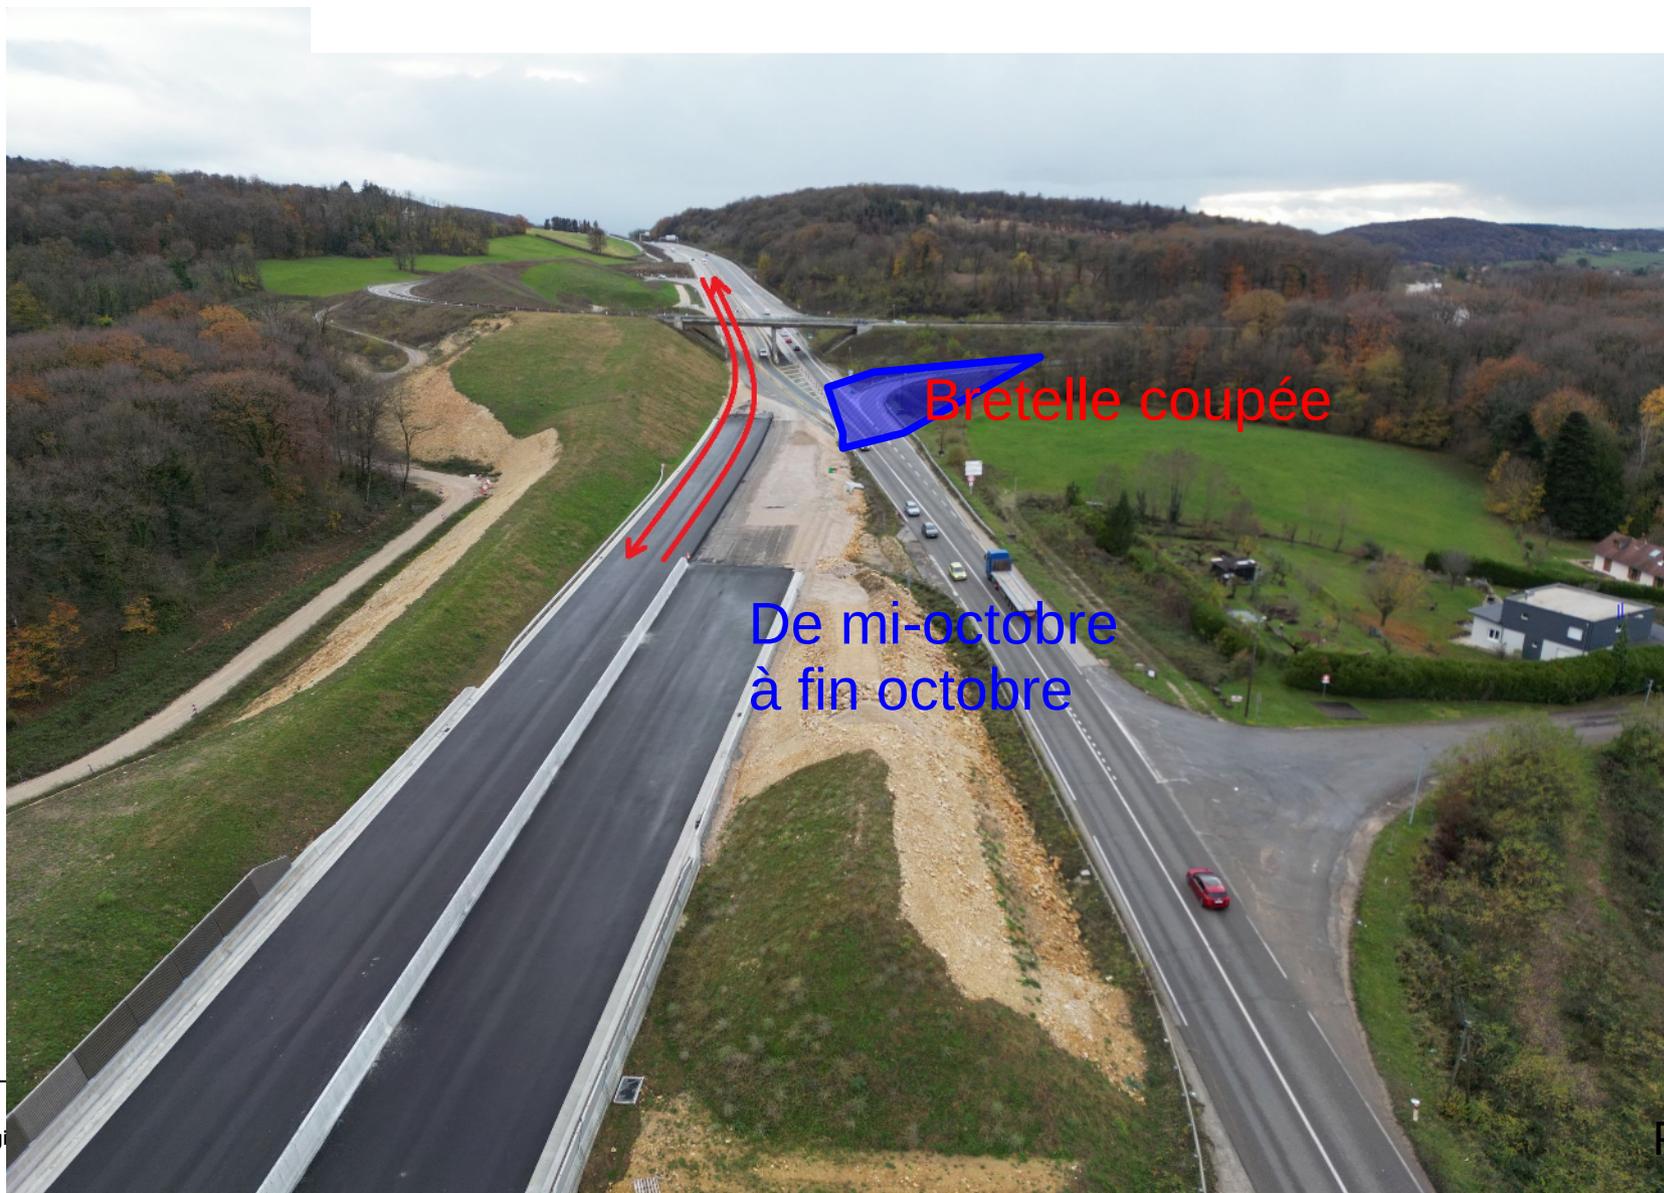

BRETELLE Devecey → Vesoul + Giratoire de Devecey

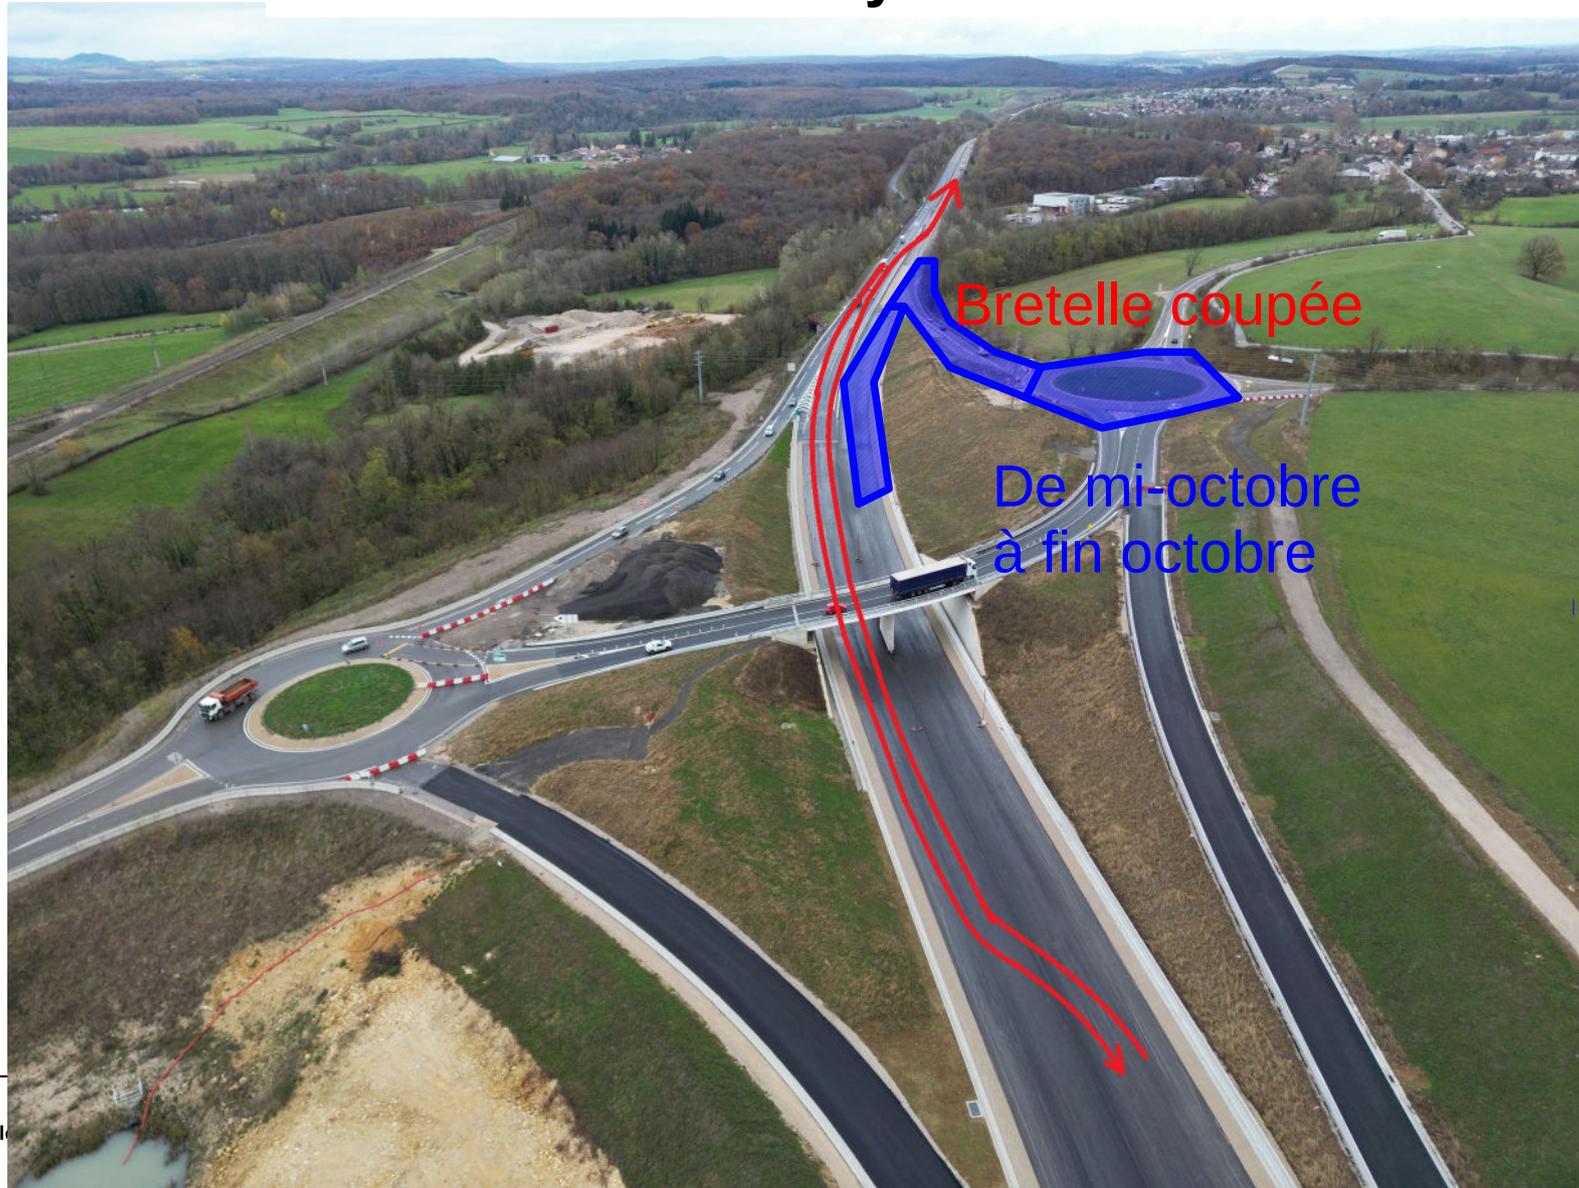

PLANNING DES ETAPES A VENIR

*Perturbations
de circulation
prévues*

- A partir de début novembre :
Maintien de la mise en service partielle de la nouvelle RN57 (une voie dans chaque sens)

Durée

2 semaines

*Travaux
réalisés*


- Travaux de finition
- Inspection préalable à la mise en service

PLANNING DES ETAPES A VENIR

Mise en service définitive à 2x2 voies prévue fin novembre 2024
(calendrier prévisionnel « hors intempéries »)

LA COMMUNICATION PENDANT LE CHANTIER

- Lettres d'information régulières, publiées dans toutes les communes riveraines
- Informations disponibles sur le site internet de la DREAL
- Une boîte mail a été créée spécifiquement pour recueillir les observations et interrogations pendant le chantier :

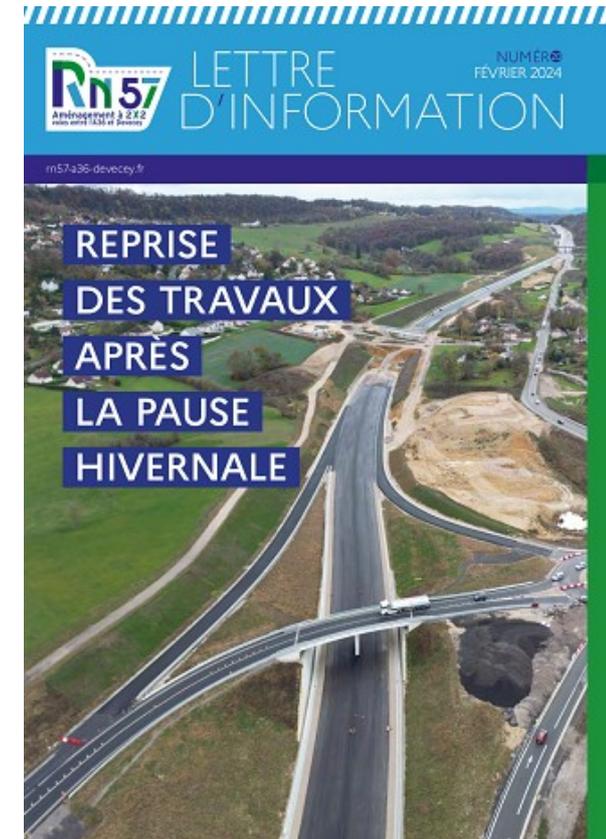


RN57_A36_DEVECEY@developpement-durable.gouv.fr

2. Travaux de la rue Léon Baud : présentation de l'aménagement définitif et calendrier de finalisation des travaux (DREAL et GBM)

CONFIGURATION DE LA CIRCULATION SUR LE NOUVEL OUVRAGE DE LA RUE LEON BAUD


- Une seule voie de circulation pour les automobilistes au niveau de l'ouvrage
- Sens montant prioritaire
- Une voie cyclable double sens
- Un trottoir

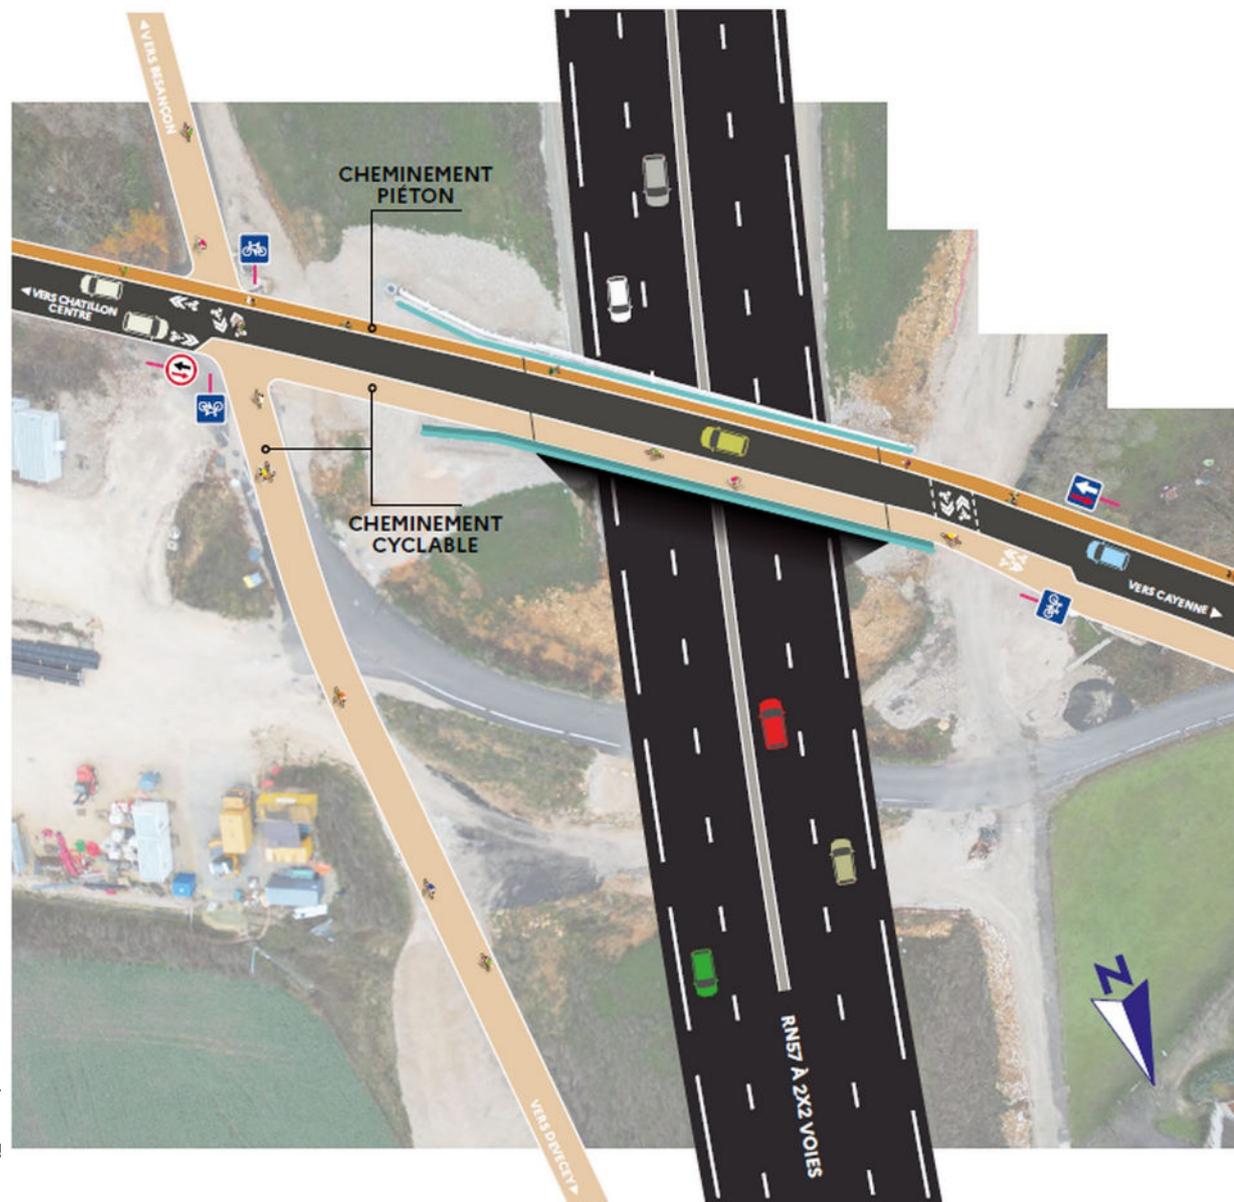

2. Travaux de la rue Léon Baud : présentation de l'aménagement définitif et calendrier de finalisation des travaux (DREAL et GBM)

CONFIGURATION DE LA CIRCULATION SUR LE NOUVEL OUVRAGE DE LA RUE LEON BAUD

- Continuité des cheminements cyclables dans le cadre du projet

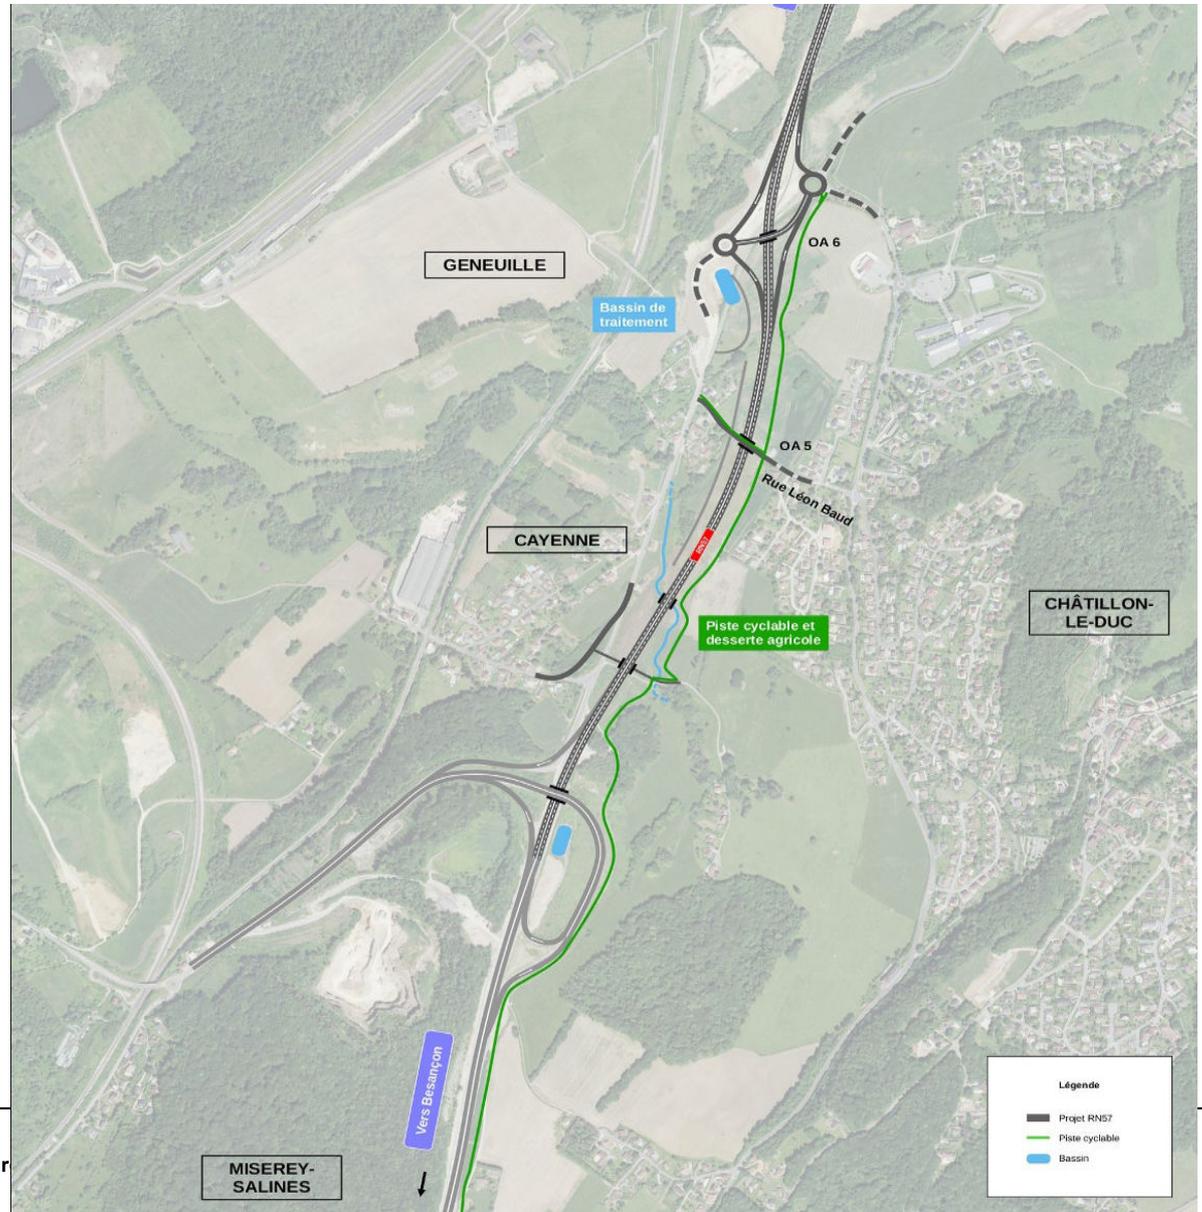



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de
l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté**

Service Transport - Mobilités

Département Maîtrise d'Ouvrage
Routière



**MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
COHÉSION DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Déviation mise en place pendant la fermeture de la bretelle Vesoul → Gare TGV :

